

สรุปงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ในพื้นที่ แขวงทางหลวง ในสังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

ข้อมูล ณ 13 พ.ย.2566

ลำดับ	ทล.	ตอน	กม.ดำเนินการ		เลขที่สัญญา	สิ้นสุด	วงเงินตามสัญญา	ผลงาน(%)	ในพื้นที่แขวงฯ
1	2	อุดรธานี - สระใคร (เป็นตอนๆ)	466+355	485+430	สท.2/23/2564	9 ก.พ. 2567	679,500,000.00	99.112	อุดรธานีที่ 1
2	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.บ้านเขว้า - ชัยภูมิ	236+755	251+690	สท.2/3/2563	21 ม.ค. 2567	621,325,100.00	80.894	ชัยภูมิ
3	225	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัวระเหว - อ.บ้านเขว้า	221+135	236+755	สท.2/30/2564	18 ส.ค. 2567	519,667,260.00	72.579	ชัยภูมิ
4	229	อ.มัญจาคีรี - แยกช่องสามหมอ	17+625	54+621	สท.2/26/2564	11 มิ.ย. 2567	1,129,429,778.94	96.620	ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
รวม งานโครงการก่อสร้างทางหลวงขนาดใหญ่							2,949,922,138.94		

โครงการก่อสร้างฯ ในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี

➤➤➤➤➤ โครงการก่อสร้าง ทล.2 สาย อุดรธานี – สระใคร (เป็นตอน ๆ)

ช่วงที่ 1 ระหว่าง กม.466+355 – กม.468+515

ช่วงที่ 2 ระหว่าง กม.472+400 – กม.485+430

รวม ระยะทาง 15.190 กิโลเมตร

สัญญาที่ สท.2/23/2564 ลงวันที่ 23 สค. 2564

สิ้นสุด 9 กพ. 2567

ค่างานตามสัญญา 679,500,000.00.- บาท

ระยะเวลา 900 วัน

นายช่างโครงการ นายวัฒนา แก้วนามชัย


ผู้รับจ้าง บริษัท วณิชชัยก่อสร้าง จำกัด


ผลงาน ณ 25 ตค.2566 = 99.112% (+20.437%)



แผนที่ตั้ง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย อุตรธานี – สระใคร (เป็นตอน ๆ)

ที่ตั้งโครงการ

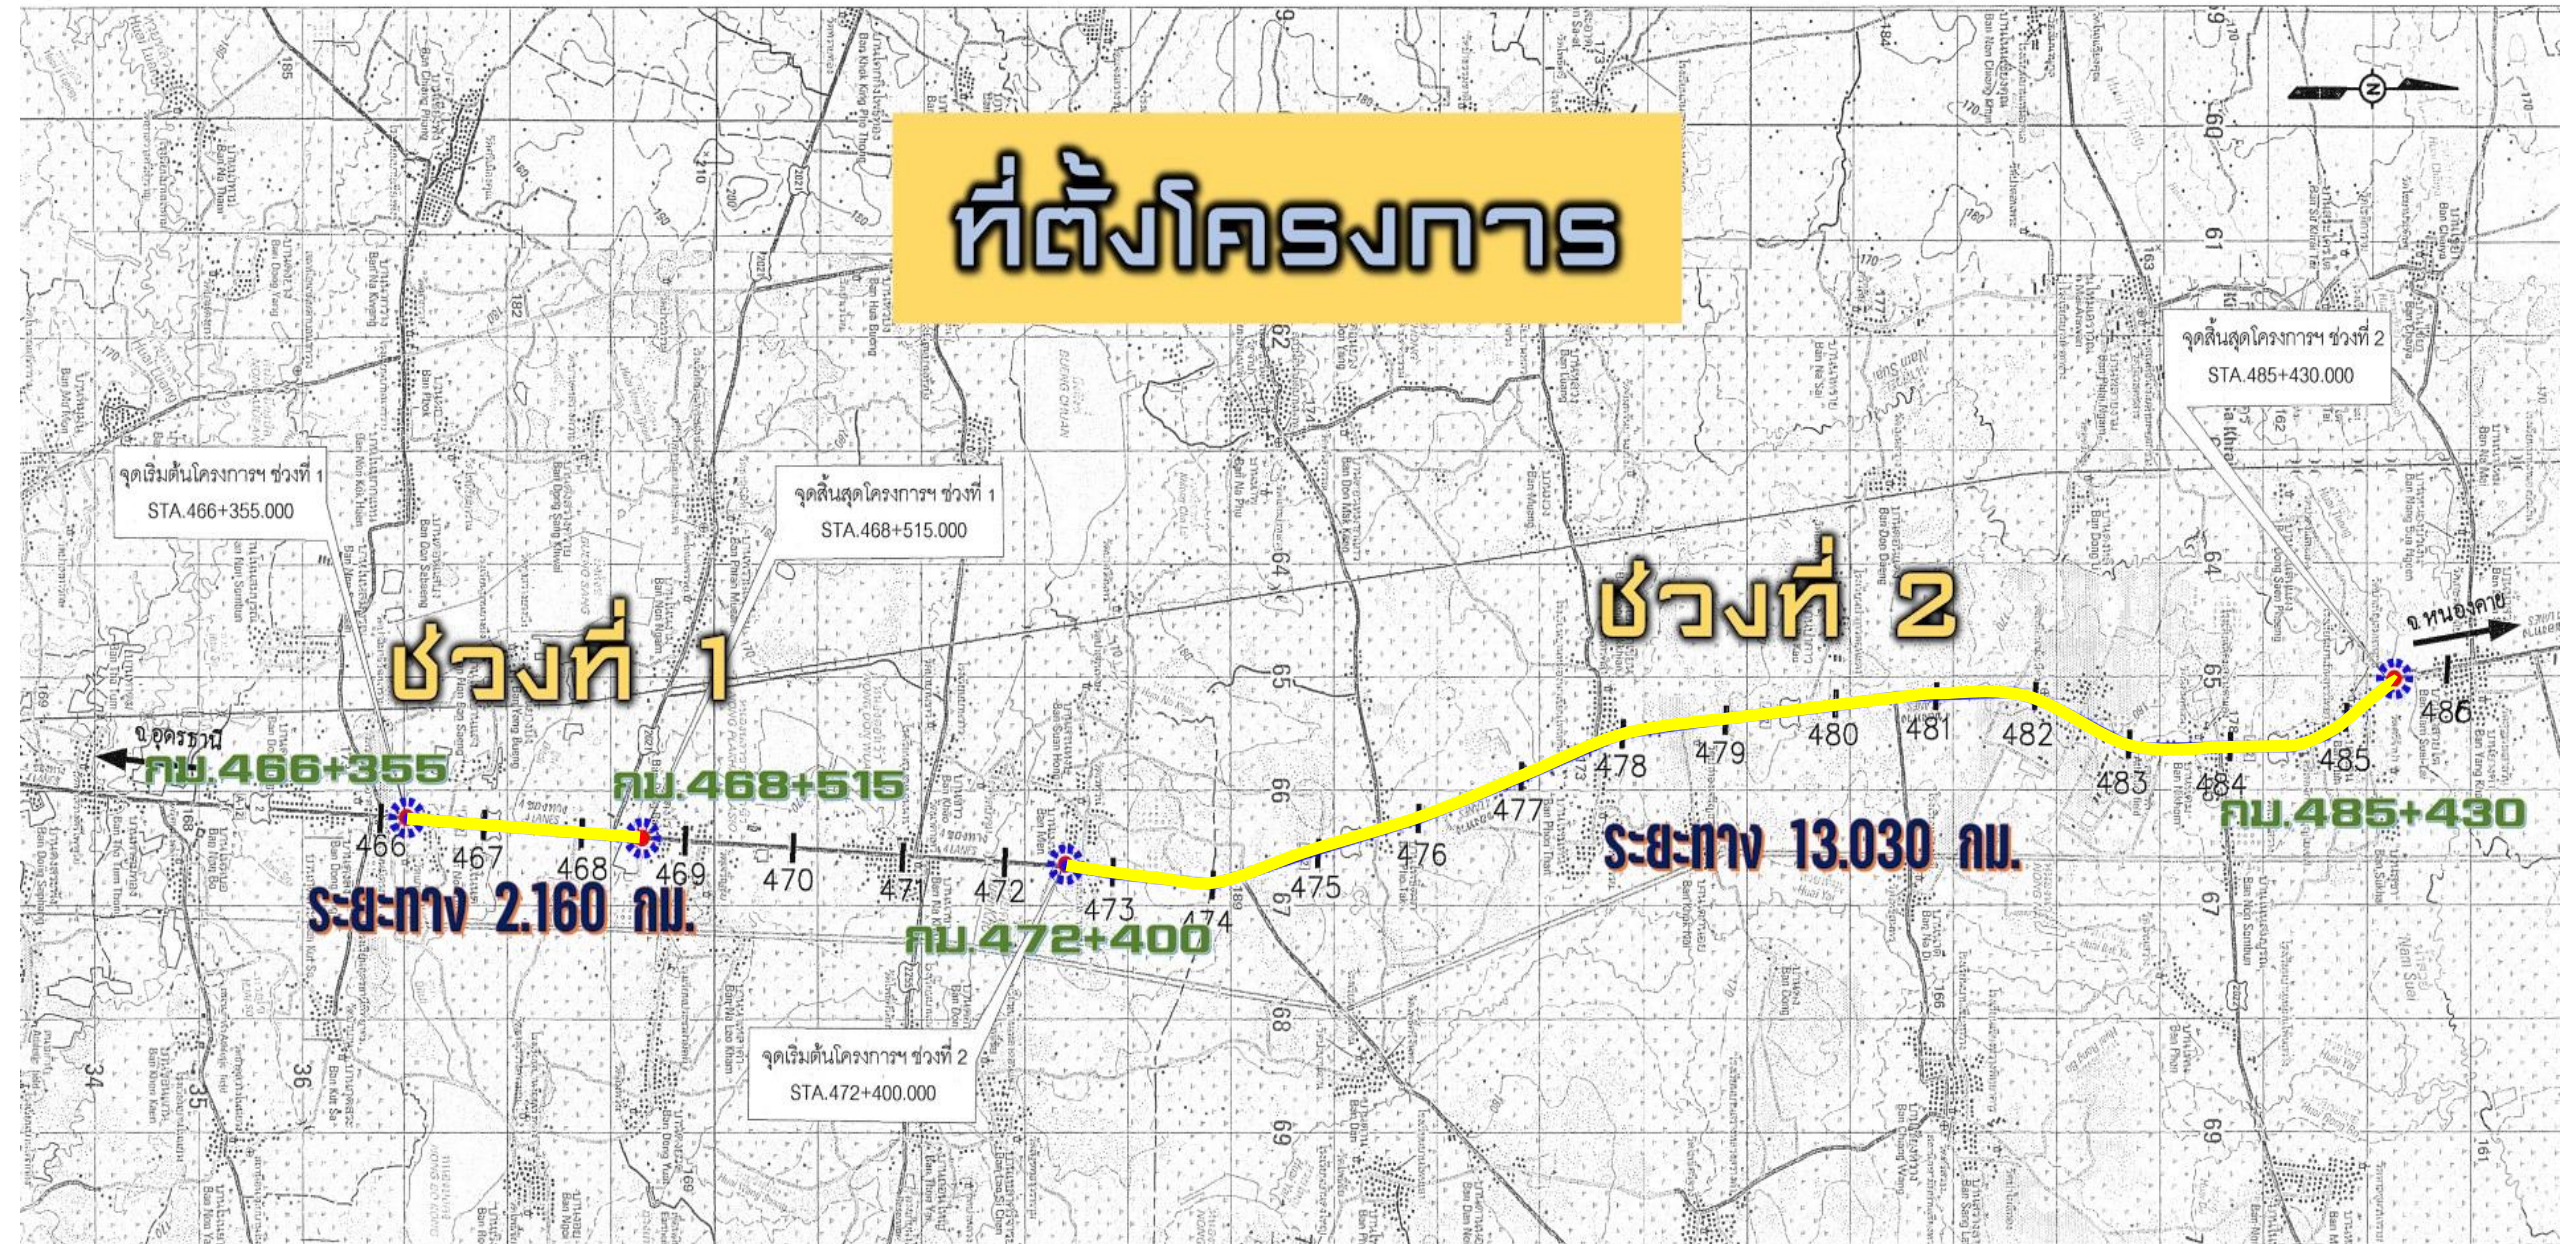

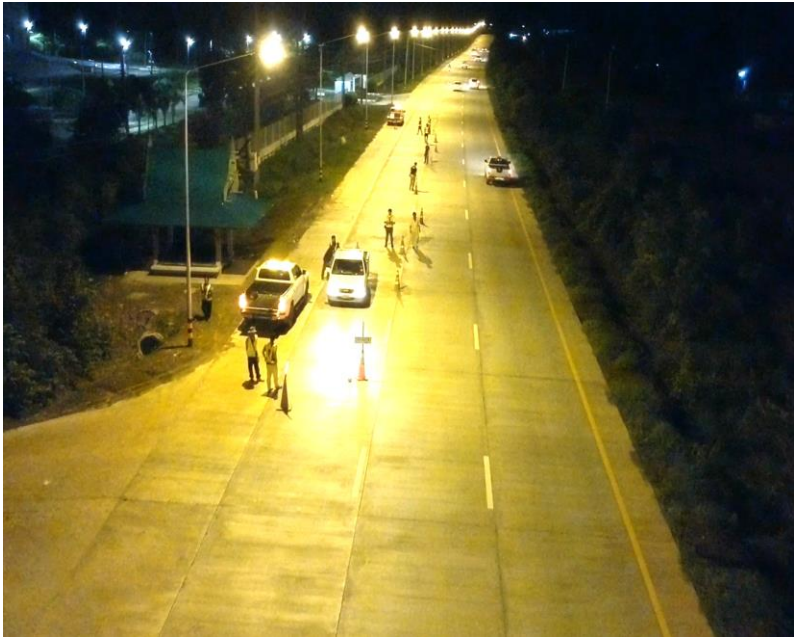

โครงการก่อสร้างฯ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

➤➤➤➤➤ โครงการก่อสร้าง ทล.225 สาย นครสวรรค์ – ชัยภูมิ
ตอน อ.บ้านเขว้า - ชัยภูมิ

ระหว่าง กม.236+755 – กม.251.690 ระยะทาง 14.935 กิโลเมตร

สัญญาที่ สท.2/3/2563 ลงวันที่ 2 กค. 2563

สิ้นสุด 21 มค. 2567

ค่างานตามสัญญา 621,325,100.00.- บาท

ระยะเวลา 780 วัน


นายช่างโครงการ นายสุพิทย์ ศรีด่าง


ผู้รับจ้าง บริษัท ทิพากร จำกัด

ผลงาน ณ 25 ตค.2566 = 80.894% (-19.106%)



แผนที่ตั้ง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ – ชัยภูมิ ตอน อ.บ้านเขว้า - ชัยภูมิ

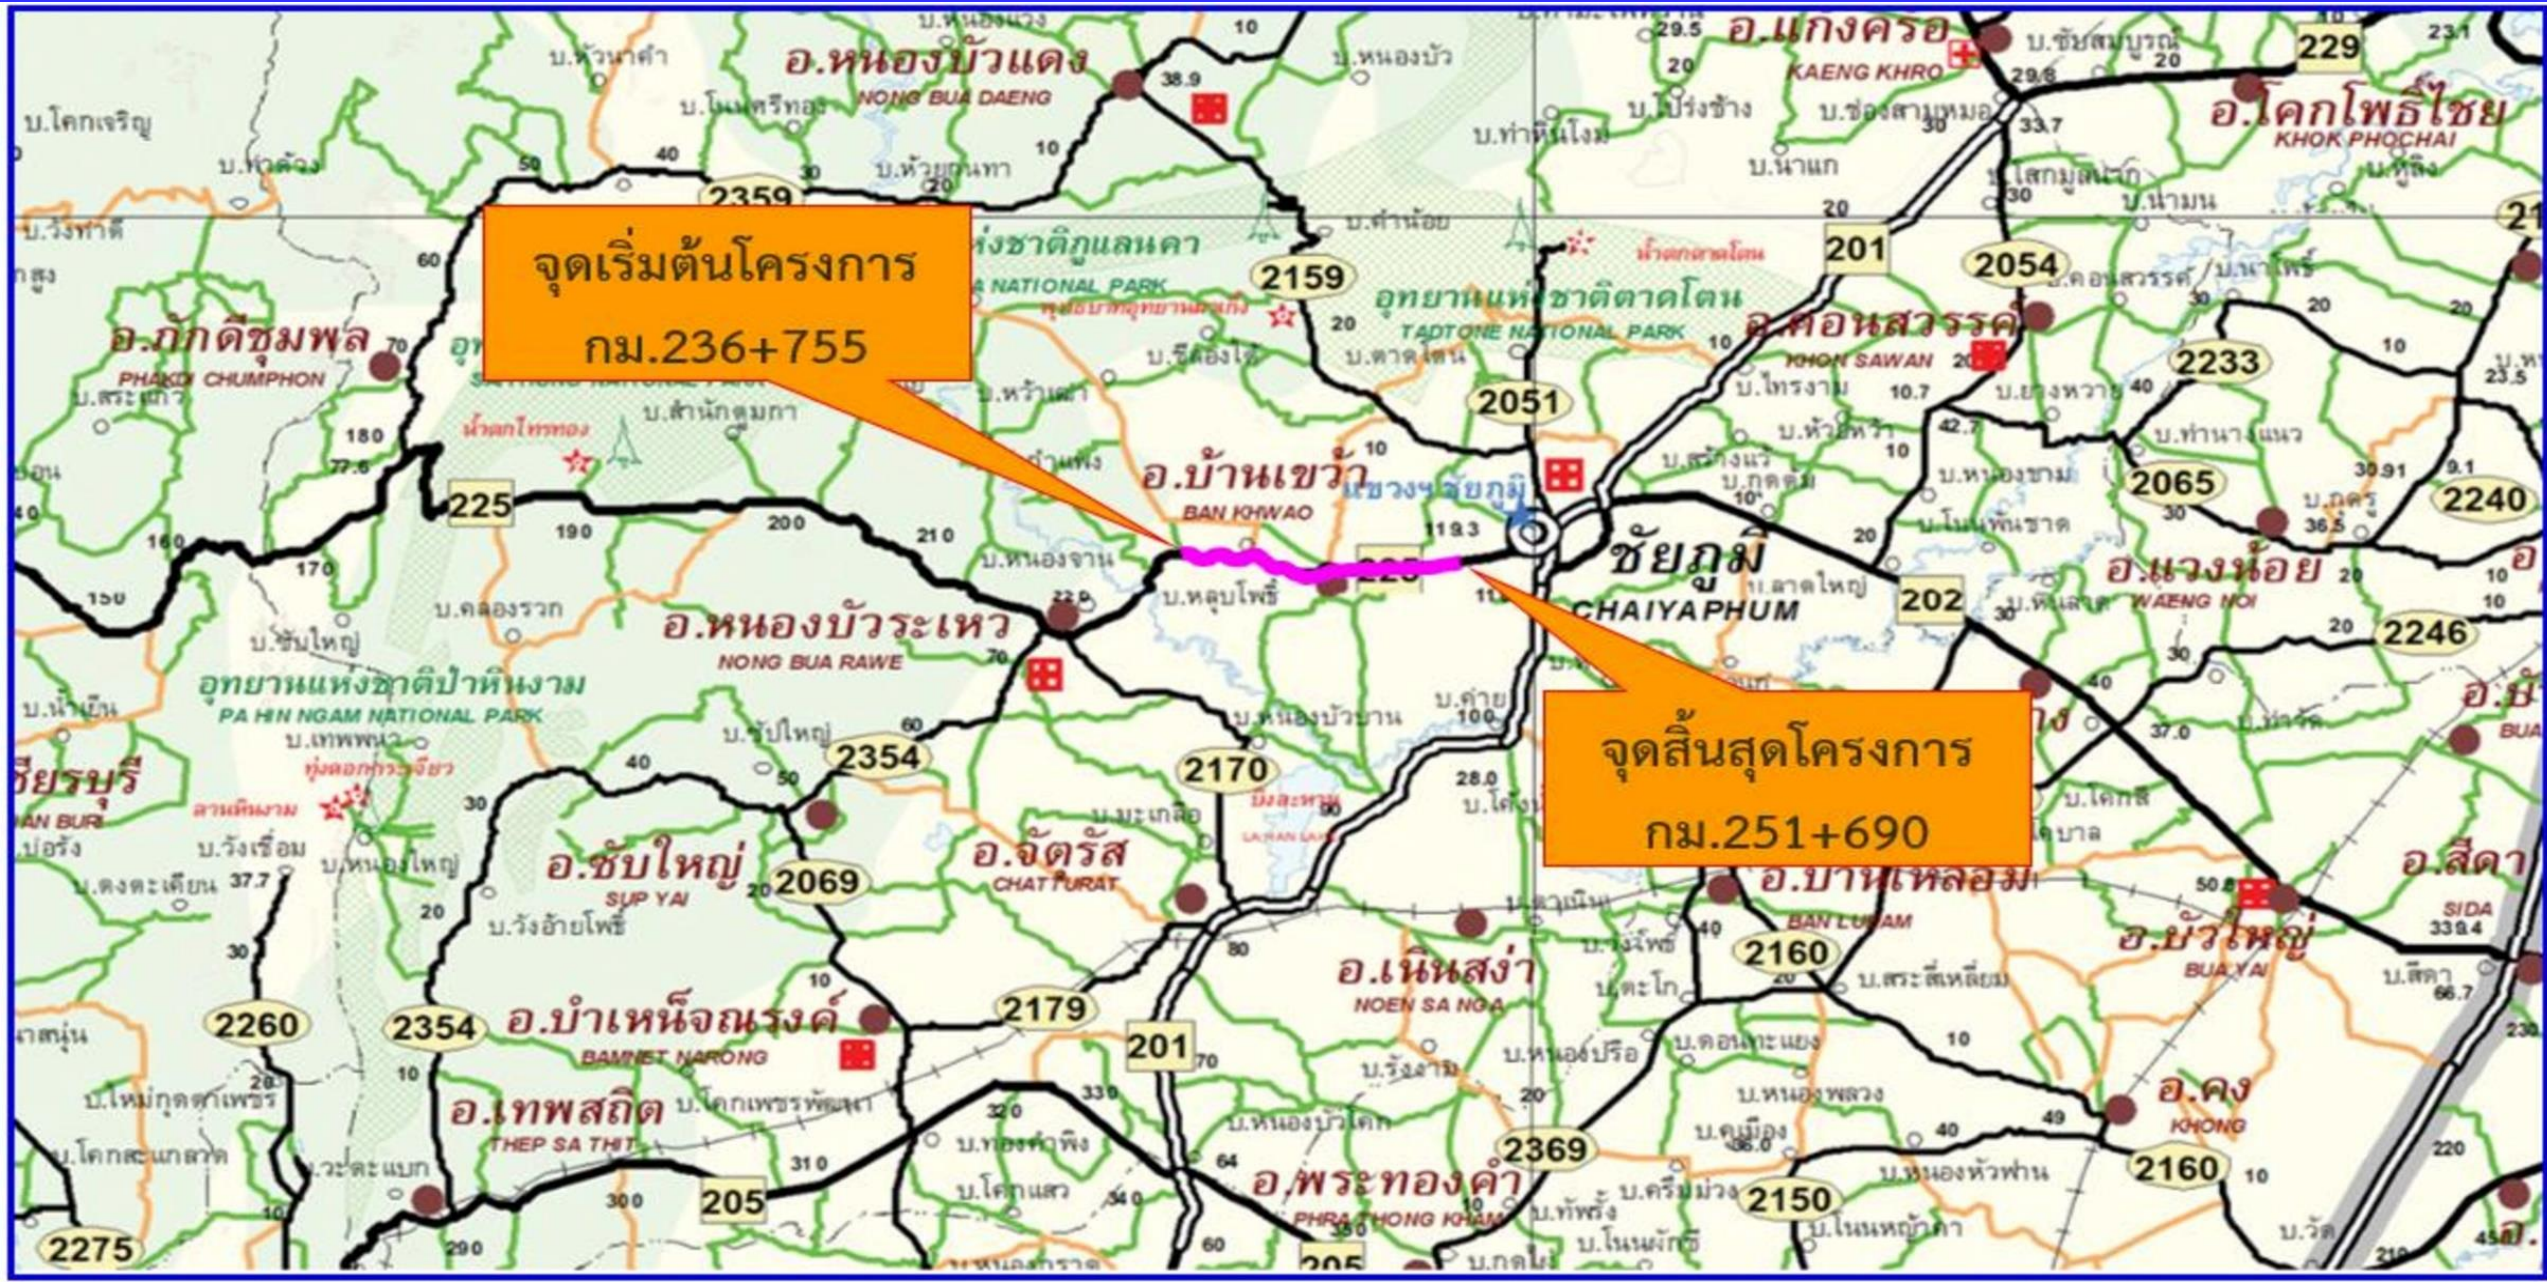

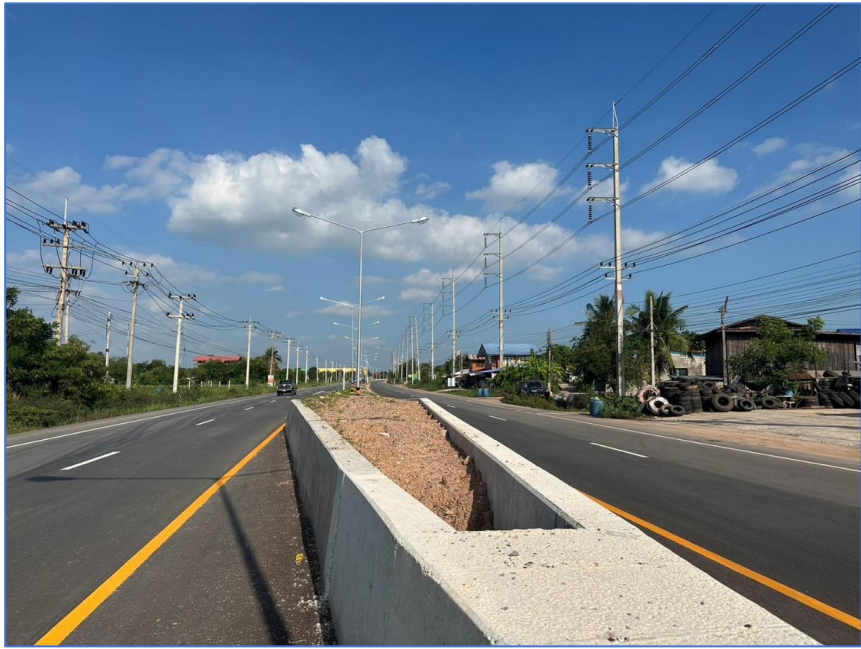

โครงการก่อสร้างฯ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

➤➤➤➤➤ โครงการก่อสร้าง ทล.225 สาย นครสวรรค์ – ชัยภูมิ
ตอน อ.หนองบัวระเหว – อ.บ้านเขว้า

ช่วงที่ 1 ระหว่าง กม.221+135 – กม.222+075

ช่วงที่ 2 ระหว่าง กม.225+240 – กม.236+755

รวม ระยะทาง 12.455 กิโลเมตร

สัญญาที่ สท.2/30/2564 ลงวันที่ 9 กย. 2564

สิ้นสุด 18 สค. 2567

ค่างานตามสัญญา 519,667,260.00.- บาท

ระยะเวลา 780 วัน


นายช่างโครงการ นายประสงค์ ทิพย์เจนรวี

ผู้รับจ้าง บริษัท ทำรากก่อสร้าง จำกัด

ผลงาน ณ 25 ตค.2566 = 72.579 % (+6.307%)



แผนที่ตั้ง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ – ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัวระเหว - อ.บ้านเขว้า

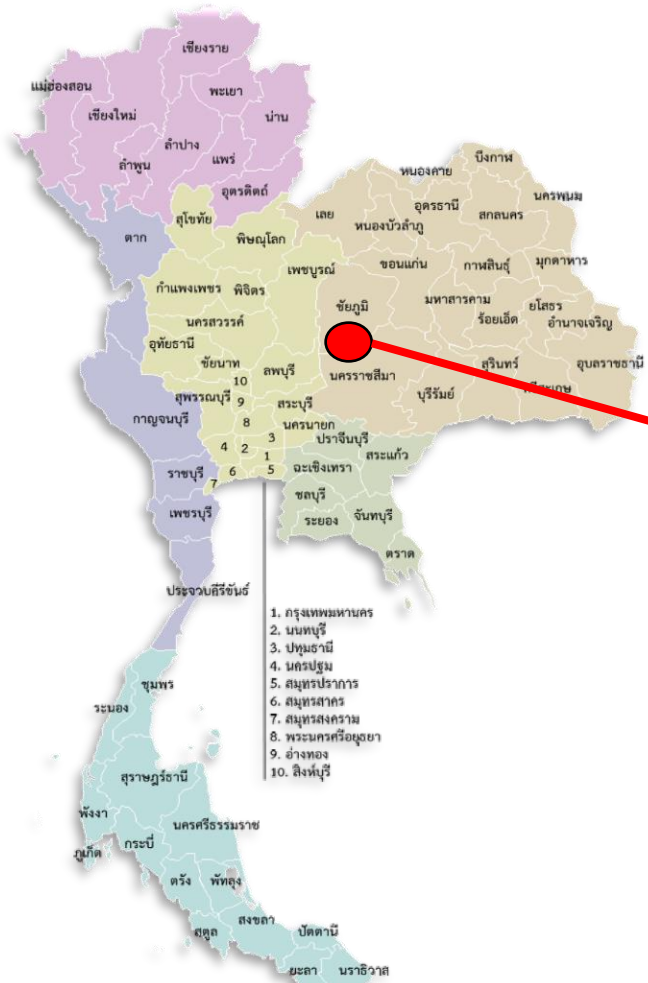



โครงการก่อสร้างฯ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

โครงการก่อสร้าง ทล.229 สาย มัญจาคีรี – แยกช่องสามหมอ

โครงการฯ (ช่วง 1) : กม.17+625.000 – กม.19+559.000

โครงการฯ (ช่วง 2) : กม.26+300.000 – กม.37+875.000

โครงการฯ (ช่วง 3) : กม.39+650.000 – กม.41+075.000

โครงการฯ (ช่วง 4) : กม.43+220.000 – กม.54+621.000

ระยะทาง 1.934 กม.

ระยะทาง 11.575 กม.

ระยะทาง 1.425 กม.

ระยะทาง 11.401 กม.

รวม ระยะทาง 26.335 กิโลเมตร

สัญญาที่ สท.2/26/2564 ลงวันที่ 26 สค. 2564

สิ้นสุด 11 มิย. 2567

ค่างานตามสัญญา 1,129,429,778.94.- บาท

ระยะเวลา 1,020 วัน

นายช่างโครงการ นายจักรกฤษณ์ สิทธิเสือ

ผู้รับจ้าง บริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด

ผลงาน ณ 16 พย.2566 = 96.620 % (+5.648%)



ก่อสร้าง ขยายคันทาง จากเดิม 2 ช่องจราจร (7/9) เป็น 4 ช่องจราจร


เกาะกลางแบบ Concrete Barrier , Raised Median และ Depress Median

ประกอบด้วย ผิวทางแอสฟัลต์ 23.039 กม.

ผิวทางคอนกรีต (JRCP 25 cm.) 3.296 กม.

รวม 26.335 กม.

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 สาย อ.มัญจาคีรี - แยกช่องสามหมอ

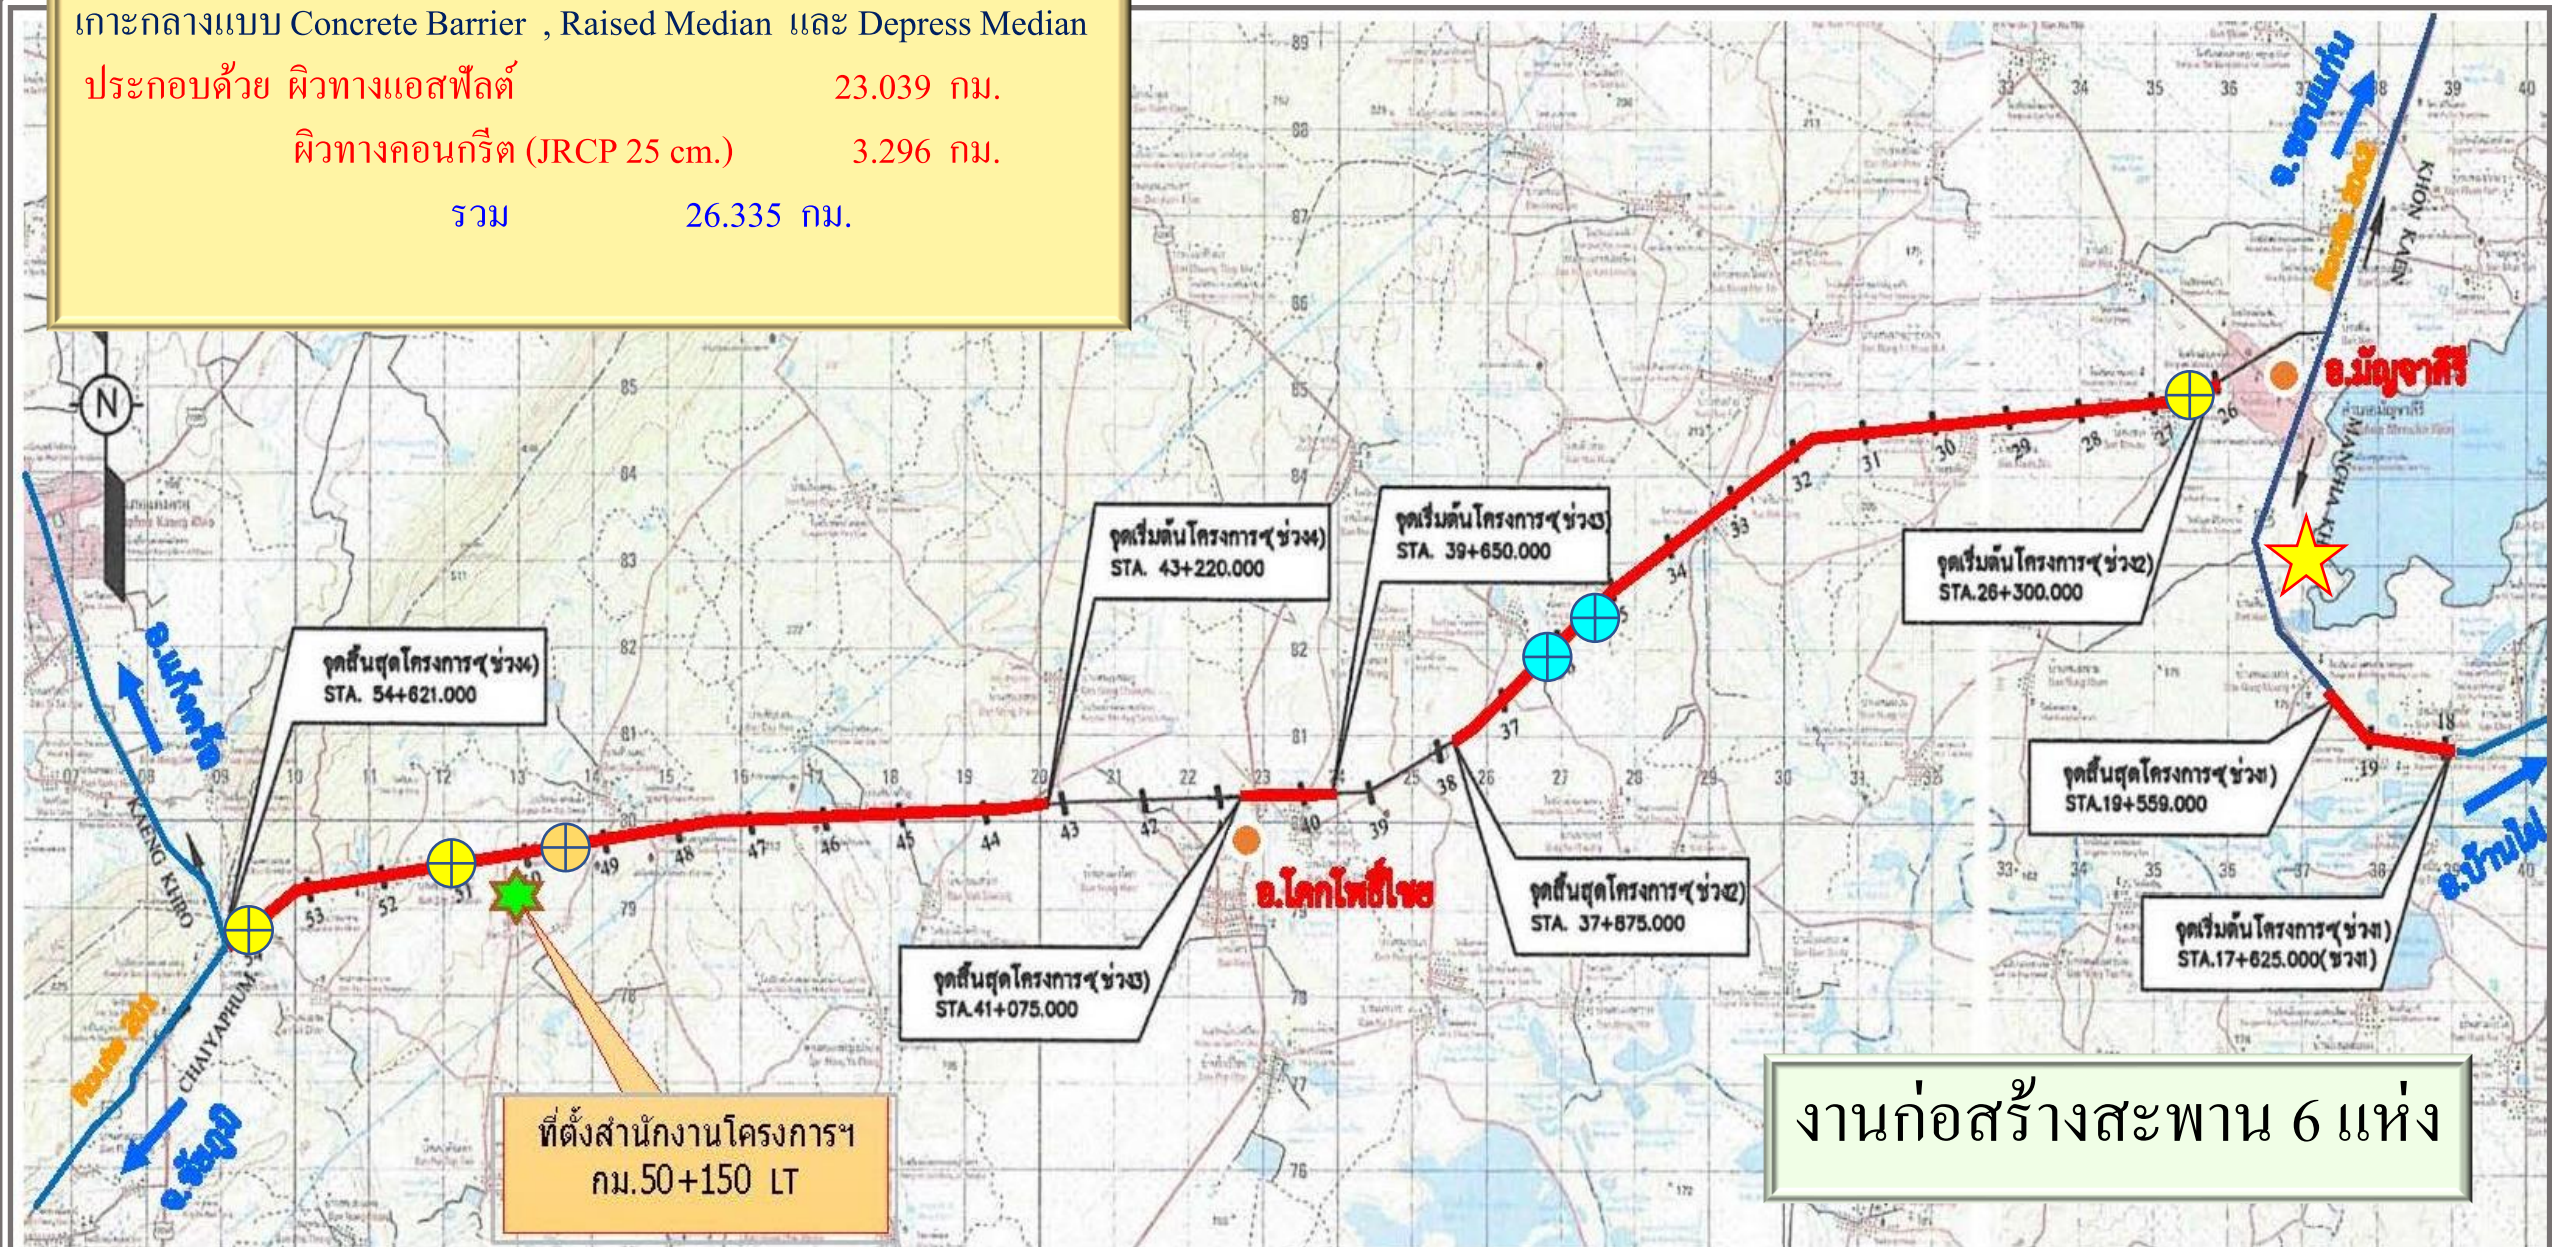

ที่ตั้งสำนักงานโครงการฯ
กม.50+150 LT

งานก่อสร้างสะพาน 6 แห่ง



ASPHALT CONCRETE



งานไฟฟ้า



SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIERS



งานปลูกหญ้า BLOCK SODDING



THERMOPLASTIC PAINT

